御影石バーナー仕上げの浴室のエフロ除去と防滑施工

石材 -③-1

施工：認定施工販売店・富士宮市　(株)鈴木化成品

ソフィアビューヒルズ浴室の御影石のぬめりとエフロを除去し、滑り止めと汚れ防止施工

エフロ除去後、素足用下地処理剤 C を塗布：30 分後中和剤

素足用下地処理剤 C を塗布して、30 分後に素足で滑り止めの確認を行いました。



素足で滑り止めの確認後、直ちに中和剤を塗布しました。

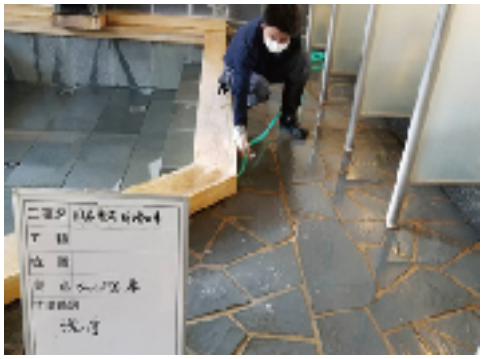

中和剤塗布乾燥後、石材用上塗り剤を塗布し、素足で防滑確認
